




Date/Time 28/12/2022 15:26:13

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 23/12/2022 11:24:06

REM\MONDOPLASTICO\CALANDRA L\POMPA PRIMO CILINDRO CALANDRA L\POMPA\P1V\103 Spettro
macchina > 600

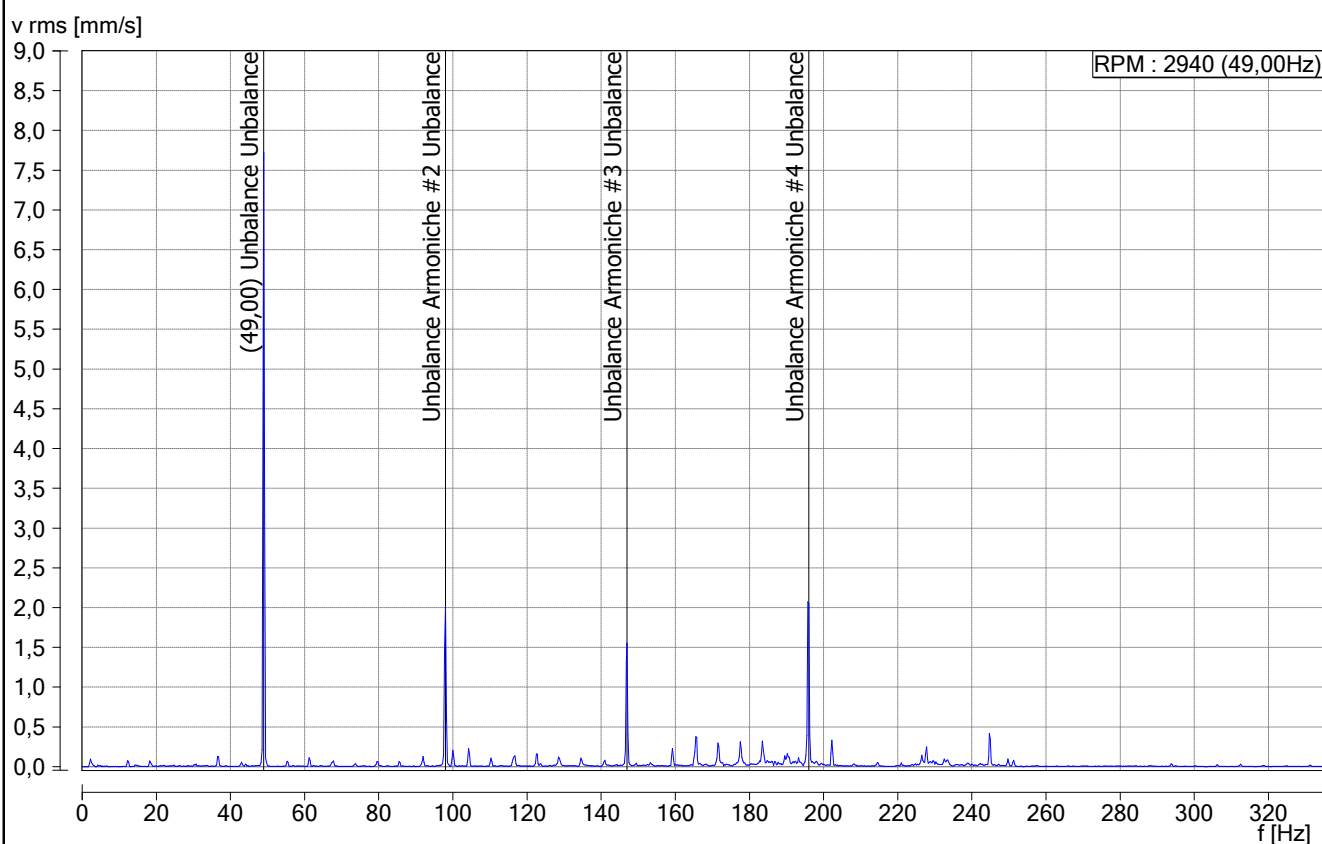

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,00) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2940	
RMS	Y [mm/s]	= 8,48	

Data	Ora	Evento	Commento
14/03/2022	12:57:43	Misura mancante	Misura mancante.
06/08/2021	16:31:50	Misura mancante	Misura mancante.
04/01/2021	09:47:45	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 28/12/2022 15:26:14 Page 2 of 2

03/11/2020	15:17:50	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:57	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	49,00	7,72
2	195,75	2,07
3	98,00	2,02
4	147,00	1,55
5	244,75	0,42
6	165,50	0,38
7	202,25	0,33
8	183,50	0,32
9	177,50	0,31
10	171,50	0,30
