




Date/Time 16/03/2018 12:42:51

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 21/02/2018 10:10:36

Siniat\Zona 1\Ventilatore Aria Circolazione 1 - 84\Ventilatore\Punto 3 RO\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm

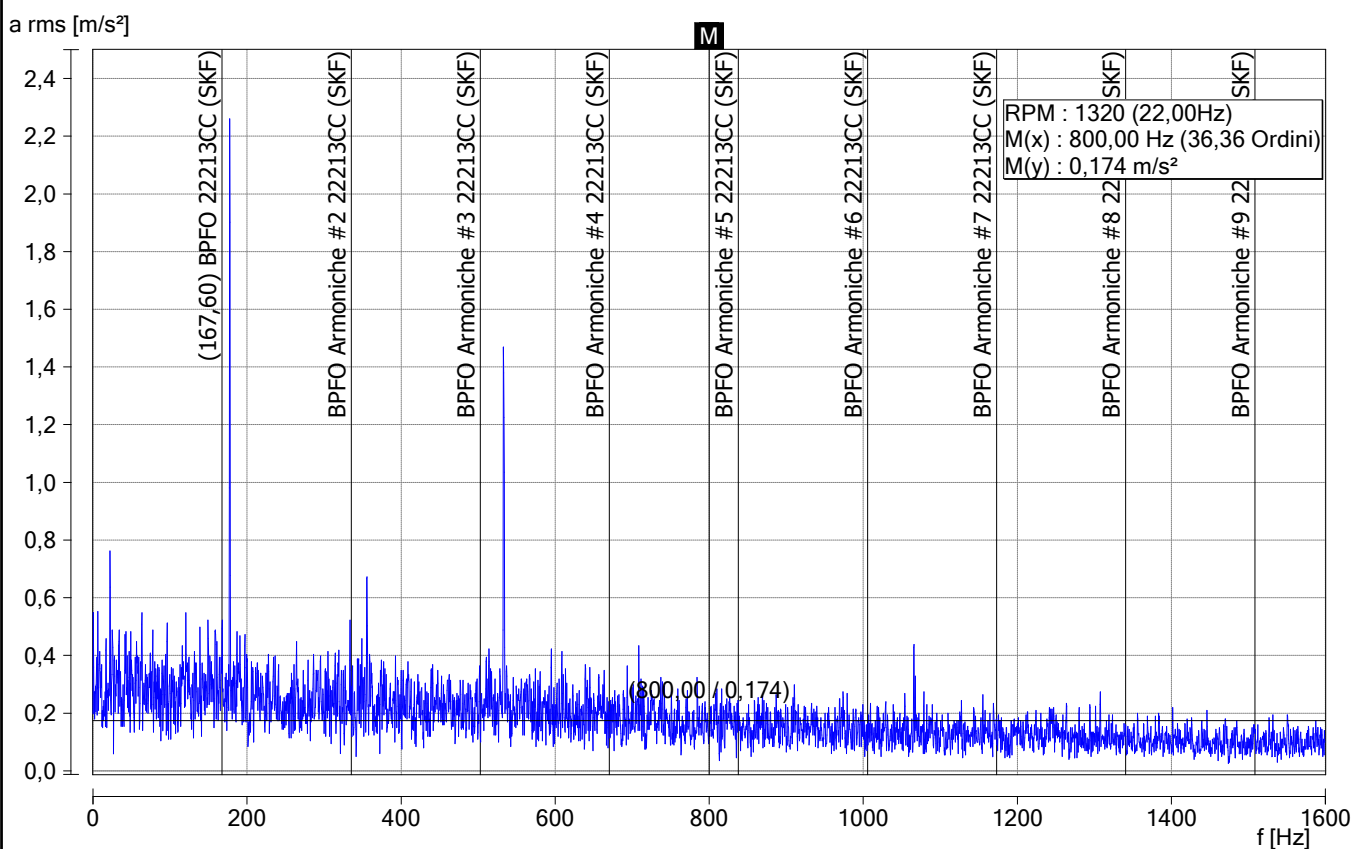

Cursore Principale X [Hz] = 800,00 (167,60) BPFO 22213CC (SKF)

Y [m/s²] = 0,174

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 1320

RMS Y [m/s²] = 8,53

Data	Ora	Evento	Commento
21/02/2018	13:59:42	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1484, nuovo rif. 1320.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 16/03/2018 12:42:52

Page 2 of 2

22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	177,60	2,260
2	532,80	1,468
3	22,00	0,762
4	355,60	0,672
5	6,40	0,553
6	0,40	0,549
7	63,60	0,548
8	120,40	0,548
9	149,20	0,523
10	168,00	0,523
